イズミクリーンコンパクト型/設置前確認表

1 **設置スペース**が確保できること

2 本体設置部分は**開き扉**である

3 排水口が**丸型**であること

変形排水口の場合
アダプター対応可能
楕円　D型　etc

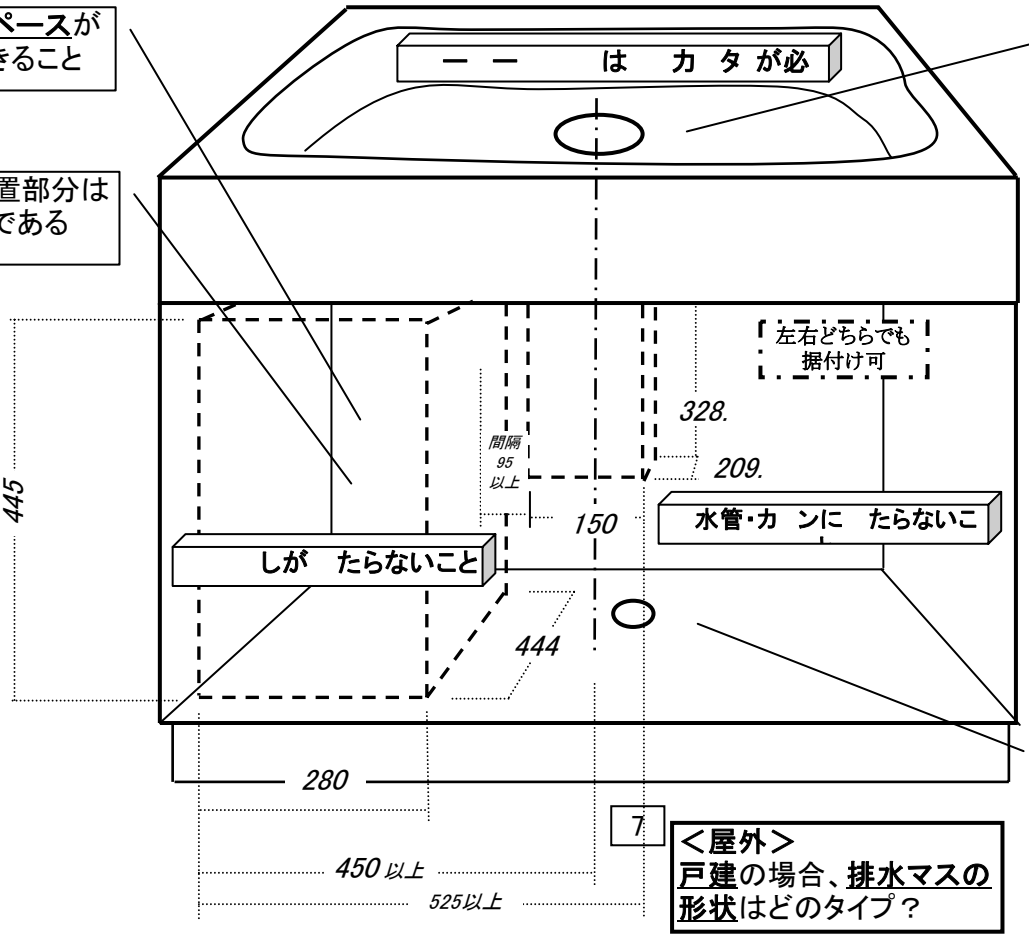

5 **電源**が確保できること

6 **アース**が確保できること

4 カバーを取ると、シンク中床の穴(開口)と**排水管の位置**が合っていること

7 ＜屋外＞
戸建の場合、**排水マスの形状**はどのタイプ？

お客様にもご協力いただき、手配前に必ず上記 1 ～ 7 の項目を確認して下さい。

※一部のチェック項目に記載してある概算金額は、過去の事例をもとに表示してあり、お見積もり金額と異なる場合があります。

Yes　No

1 **粉砕機と処理機の設置スペースは確保出来ているか**　［　し　］

設置スペース　幅　52．5cm以上、　奥行　44．5cm以上、　高さ　45cm以上

※(シンクの穴の中心から45cm以上)＝(粉砕機の端から525cm以上)

→ 取付可能

2 シンクの扉（本体設置部分のみ）は、開き扉である。　［　水管・カ　ンに　］

→ □ 有料

別途費用 → 引出型のキッチンに取り付けたい場合は、別途工事としてご相談を受け賜わります。
（引出切込作業（概算　約5～6万円））

3 排水口は丸型であるか　※L(185mm)・M(180mm)・S(別手配)3種類のアダプターリングで対応。

→ □ 有料

別途費用 → D型もしくは楕円型である　※ 変形排水口アダプター対応可　［　ー　ーシンク・　］
〔メーカー名＿＿＿＿＿＿　機種名＿＿＿＿＿＿＿＿　型番＿＿＿＿＿＿＿＿〕
（概算　約1万円～約5・6万円前後）

4 穴(開口)と排水管の位置が合っている

→ □ *無料*

（シンクの中床に穴を開けて対応する）

5 電源（100vコンセント625w以上）の確保ができるか

→ □ 有料

別途費用 → 延長コード、配線設置などによってシンク内に電源を確保します。（標準工事：10m以内）
（ブレーカー以降の電気工事　概算　約5千～1万5千円）

6 アースが接続できるか

→ □ 有料

別途費用 → アース端子への接続、または屋外への埋設・配線・接続によってアースを確保します。
（アース工事　概算　約5千～1万円）

7 戸建の場合は、汚水マスの種類はどれですか？　**（番号を○で囲んでください。）**

→ マンション

別途費用 → ＜4＞の汚水マス

＜標準工事で対応できるタイプ＞

＜1＞　＜2＞　＜3＞



＜別途工事が必要なもの＞

＜4＞



別途費用

（直接排気工事　概算　約2～3万円）

→ 戸建 ＜1＞ ＜3＞ / 戸建 ＜4＞ → □ 有料

取付OK
